

Комитет по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края

*Обзор несчастных случаев
с тяжелым и смертельным
исходами, произошедших
при выполнении работ на высоте
в организациях Хабаровского края
за 2018-2019 годы*



Комитет по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края

Обзор несчастных случаев с тяжелым и смертельным исходами, произошедших при выполнении работ на высоте в организациях Хабаровского края за 2018-2019 годы подготовлен комитетом по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края в соответствии с подпрограммой «Улучшение условий и охраны труда в Хабаровском крае государственной программы Хабаровского края «Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края», утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 20 апреля 2012 г. № 125-пр.


Основной целью обзора является информирование работодателей и специалистов по охране труда об обстоятельствах и причинах несчастных случаев на производстве. Использование работодателями бюллетеня позволит принять меры для предупреждения подобных случаев производственного травматизма.

Данный материал подготовлен для руководителей и специалистов по охране труда организаций края, руководителей органов государственной власти и местного самоуправления края, профессиональных объединений предпринимателей, выборных органов первичных профсоюзных организаций, преподавателей и студентов образовательных учреждений.

Численность пострадавших в крае в результате несчастных случаев, произошедших при выполнении работ на высоте в Хабаровском крае

■ со смертельным исходом

■ с тяжелым исходом

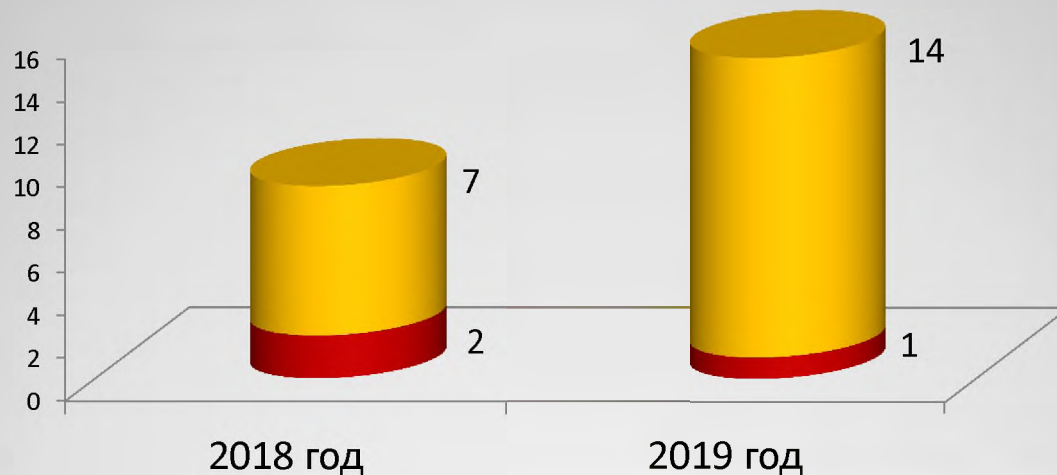

Основные причины несчастных случаев

1

недостатки в
организации и
проведении
подготовки
работников по
охране труда

2

неприменение
работниками
средств
индивидуальной
защиты, средств
страховки при
работах на
высоте

3

использование
средств
подмащивания и
лестниц, не
отвечающих
требованиям
безопасности

4

отсутствие
ограждений
опасных зон

МУП "ПРОГРЕСС"

Пострадавший осуществлял доставку питьевой воды на грузовом водовозном автомобиле. Для заправки цистерны водой водитель поднимался на площадку цистерны, расположенную на высоте 2 метра 13 сантиметров от земли, и через заливную горловину производил заправку с помощью заливного шланга. Для предотвращения падения с высоты водителю был выдан страховочный пояс. Во время очередной заправки водой пострадавший находился на площадке цистерны без страховочного пояса. При вытаскивании заливного шланга из горловины люка он потерял равновесие и упал с платформы цистерны на землю, получив при падении смертельную черепно-мозговую травму.



ООО "ГОРНОЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО"

Бригада, в составе которой работал пострадавший, получила заказ-наряд на проведение работ по бетонированию технологической площадки на строящемся объекте – цехе гидрометаллургии, на высоте 8,4 метра. При выполнении работ пострадавший находился у края перекрытия и упал в проем между перекрытием бетонной площадки и ограждением на металлическую емкость, затем на пол цеха. В результате падения с высоты пострадавший получил травмы, от которых скончался в медицинском учреждении.





ЗАО "АЛИ"

Пострадавший получил задание отключить гирлянду, установленную на крыше здания. Расстояние от земли до края крыши составляло 4 метра. Для доступа на крышу пострадавший использовал самодельную приставную деревянную лестницу. Поднявшись по лестнице на крышу и выполнив работу, пострадавший приступил к спуску, во время которого лестница стала смещаться в сторону из-за скольжения по основанию, на которое она опиралась. В результате этого пострадавший потерял равновесие и упал на асфальт с высоты 3 метра, получив при падении тяжелую травму.



ХАБАРОВСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ – ФИЛИАЛ ОАО "РЖД"

Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи выполнял работы по монтажу арматуры СИР на опоре ЛЭП. Для подъёма на опору использовалась приставная 7-ми метровая лестница. Пострадавший использовал монтерский пояс, который был закреплён неправильно. Находясь на лестнице, при снятии переносного заземления пострадавший не удержался и упал на землю, получив тяжелые сочетанные травмы.



ООО "ФАВОРИТ"

При выполнении работ по крепежу штабеля листов металлочерепицы на крыше образовательного учреждения - средней школы № 1 в составе бригады из трех человек, пострадавший упал с конька крыши здания с высоты 10 метров, находясь при этом без каски и страховочного пояса. При падении пострадавший получил травмы, не совместимые с жизнью.



АО СТАРАТЕЛЕЙ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ РЕСУРСЫ"

Машинист бульдозера к концу рабочей смены решил обслужить бульдозер (протереть стекла). Пострадавший взял протирочный материал и поднялся на гусеничную цепь бульдозера, одну ногу поставил на ступеньку, и, при попытке подняться, потерял равновесие и упал с высоты 1,8 метра на землю, получив при этом тяжелую травму.



ООО "АВАНГАРД"

В организации произошел тяжёлый несчастный случай, в котором получил травму руководитель производства работ (прораб). При обходе объекта с целью проверки работ подрядными организациями, пострадавший упал с не ограждённого лестничного марша в открытый проем лестничной клетки на межэтажную площадку высоты около двух метров. При этом пострадавший был в каске.




ООО "ЭСТЕТ"



Временный работник – плотник при выполнении работ по демонтаже опалубки лифтовой шахты с установленных лесов, не удержавшись на конструкции, состоящей из настила лесов с перекинутой через проем между лесами и конструкцией досками, упал с высоты 4 метров, получив при этом тяжелую травму.





ООО "ПАРИТЕТ"

После окончания погрузки платформ круглым лесом при помощи металлических обвязок пострадавший – стропальщик решил проверить надежность обвязки. Заметив ослабление одной из проволоочной металлической обвязки, пострадавший решил ее подтянуть путем скручивания. Не применяя приставной лестницы, пострадавший, стоя на штабеле погруженного круглого леса и опираясь одним коленом в бревно круглого леса попытался подтянуть металлическую проволоочную обвязку. При этом не удержался на бревне круглого леса и упал на землю с высоты 4,4 метра, получив тяжелую травму.



ООО "СТРОЙМАСТЕР"



При выполнении общестроительных работ на объекте в помещении офисного здания пострадавший решил заменить элемент потолочного профиля подвесного потолка системы "Армстронг", для чего воспользовался находящейся на участке производства работ лестницей-стремянкой. Встав на четвертую ступень лестницы-стремянки, пострадавший потерял равновесие и упал с нее, получив тяжелую травму.



Комитет по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края

Обзор подготовлен под общей редакцией Н.С. Мартыненко.

Редакционная коллегия:

О.Г. Ивакаев, Н.Ф. Масленко, С.И. Ким

С предложениями и замечаниями по данному обзору необходимо обращаться в комитет по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края по адресу: 680021, г. Хабаровск, пер. Станционный, д. 21.

Телефон: (4212) 73-88-06, факс: (4212) 56-90-79,
e-mail: trudzan@adm.khv.ru
